

BON DE COMMANDE

PERGOLA HORIZON II et III LAMES PERPENDICULAIRES

Date:

Nom du client :

Prénom

Adresse

N° Tél domicile

N° Tél bureau :


Lieu de livraison :

Délai de livraison souhaité :


Référence chantier :

SENS OUVERTURE DES LAMES. FACE A LA FAÇADE.



Ouverture vers la droite. Sens Horaire.
Ouverture soleil à l'ouest pour une façade au sud



Ouverture vers la gauche. Sens antihoraire.
Ouverture soleil à l'est pour une façade au sud



DIMENSION

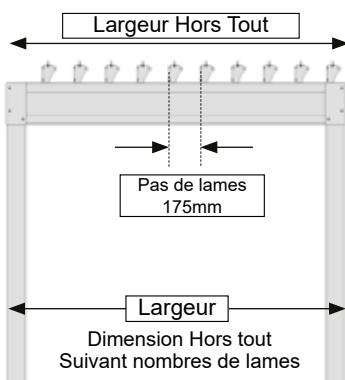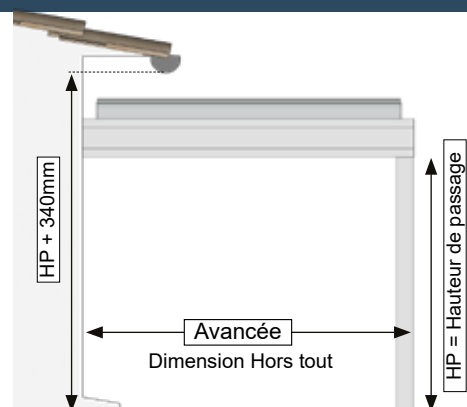

Avancée : mm

Dimension Hors tout extérieur joue
Sur mesure en mm

Largeur (Nbr de lames):

Dimension suivant pas de lames
Voir dimension exacte sur la page produit.

Hauteur de passage : mm

Dimension sous le chevron
Sur mesure en mm

Hauteur de passage maxi adossée 3000mm
Pas d'indication: standard 2500mm

POSITION MANŒUVRE VÉRIN

La manœuvre vérin sera toujours positionnée centrée sur le coffre mural.

FINITIONS

Lames : RAL 7016 ST RAL 9010

Armature : RAL 7016 ST RAL 9010

RAL sélection + value 16% Autres RAL + value 20%

OPTIONS LED

LED 1 côté LED 2 côtés LED 3 côtés

PIEDS DEPORTES

Option Pieds déportée (montage simplifié)
Déport sur profil latéral avec rainure, platine haute débordante (sans perçage). Écoulement d'eau par les joues avant.

Pieds déportés (adaptation sur chantier)
Déport sur profil latéral. Perçage et évacuation d'eau à réaliser sur chantier. Profil livré sans mécanisation. Porte-à-faux max 1 000 mm

Pieds Architectes
Déport sur profil latéral. Porte-à-faux maxi 1 000 mm
Poteaux 120 x 120 mm

MANŒUVRE VÉRIN

Standard : Télécommande + AUTOMOBISOVER

Option → AUTOMOBISOVERCLIM

BON POUR ACCORD

DEMANDE DE DEVIS
Offre de prix et dimensionnement

BON POUR COMMANDE

Fait le :

A :

Cachet de l'entreprise:

Signature:
